



令和7年10月以降の単価で積算した工事に適用

# 広島市水道局週休2日工事試行要領 (土木工事及び配管工事) (R7.10) について

[試行要領・Q&Aのダウンロードはこちらから](#)



広島市水道局 技術部 技術管理課

適用される要領の年版は特記仕様書で確認！

# 週休2日工事

土日現場閉所





## ● 完全週休2日の導入

原則、対象外工事を除くすべての土木工事及び配管工事を**完全週休2日工事**とし、完全週休2日が達成されたものとして積算し発注する。

### 【対象外工事】

- 単価契約工事
- 緊急に発注を要する応急復旧工事
- 工期算定時における実作業日数が**7日未満の工事**

※対象工事については特記仕様書に記載する。

## 広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事)(R7.10)

### ● 完全週休2日とは

完全週休2日とは、工事着手日から起算して工事完了日までの期間を7日ごとに分けた期間(週単位)において、原則土日に関し現場閉所し、週休2日以上の現場閉所を行う取組のことをいう。

工事着手日：直接工事費及び準備費として積み上げ計上されている工事目的物の施工に着手する日

工事完了日：直接工事費として積み上げ計上されている現場作業が完了した日

すべての週単位において、2日以上(2日/7日以上)の現場閉所を行った場合に完全週休2日を達成したものとする。

対象外期間を含む場合や工事完了日の関係で7日未満となる週単位は、その対象日内の土日の数以上の現場閉所で達成とする。

## ●週休2日工事における対象外期間

- ◎年未年始（12月29日から1月3日まで）の6日間
- ◎夏季休暇（8月13日から8月15日まで）の3日間

変更可

- ◎工場製作のみを実施している期間
- ◎工事全体を一時中止している期間
- ◎受注者の責によらず、代替閉所日の設定が不可能な現場作業を余儀なくされる土日

# 広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事)(R7.10)

●完全週休2日における週単位に対象外期間を含む場合や7日に満たない週単位の場合



対象外期間を含む場合

1	2	3	4	5	6	7
木	金	土	日	月	火	水
作業	作業	休日作業	夏休	夏休	夏休	代替閉所
対象	対象	対象	対象外	対象外	対象外	対象

日曜は対象外だが、土曜は対象期間なので1日の代替閉所が必要となる。



工事完成日の関係で7日に満たない週単位の場合

1	2	3	4	5	6	7
月	火	水	木	金	土	日
作業	作業	作業	完成			
対象	対象	対象	対象	対象外	対象外	対象外

閉所不要

対象期間に土日がないため、閉所なしで達成となる。

# 広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事)(R7.10)

- 完全週休2日工事における  
受注者の責によらず、代替閉所日の設定が不可能な現場作業を余儀なくされる土日



月曜から始まる週単位で金曜に地元から突発の土曜施工の要望があった場合

1	2	3	4	5	6	7
月	火	水	木	金	土	日
作業	作業	作業	作業	作業	休日作業	閉所
対象	対象	対象	対象	対象	対象外	対象

1日閉所で達成

週単位の残期間に代替閉所が不可能なため、土曜は対象外となり日曜閉所のみで達成となる。



木曜から始まる週単位で金曜に地元から突発の土曜施工の要望があった場合

1	2	3	4	5	6	7
木	金	土	日	月	火	水
作業	作業	休日作業	閉所	代替閉所	作業	作業
対象	対象	対象	対象	対象	対象	対象

2日閉所で達成

週単位の残期間に代替閉所が可能なため、代替閉所しなければ未達成となる。

## 広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事)(R7.10)

### ● 工事途中で完全週休2日が達成できなかった場合

工事途中で、やむを得ず完全週休2日が達成できない週単位が発生した場合は、**月単位の週休2日**に取り組む。

**当初から月単位の週休2日工事として実施することは認めない。**

**月単位の週休2日に移行した場合は減額となる。**

週休2日工事の補正係数			
実施内容	労務費	共通仮設費	現場管理費
完全週休2日	1.02	1.02	1.03
月単位の週休2日	1.02	1.01	1.02

## 広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事)(R7.10)

### ● 月単位の週休2日とは

月単位の週休2日は、完全週休2日が達成できなかった場合に取り組む。

月単位の週休2日とは、原則土日に現場閉所し、工事着手日から起算して工事完了日までの期間を28日ごとに分けた期間(月単位)において4週8休以上の現場閉所を行う取組のことをいう。

すべての月単位で8日(土日の数)以上(8日/28日以上)の現場閉所を行った場合に月単位の週休2日を達成したものとする。

対象外期間を含む場合や工事完了日の関係で28日未満となる月単位は、その対象日内の土日の数以上の現場閉所で達成とする。

# 広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事) (R7.10)

## ● 28日に満たない月単位の例

下の例は対象外期間の年末年始が含まれる月単位の場合を表しており、対象外期間の6日間を除く22日間が対象日数となる。対象外期間に日曜が1日含まれているため、この月単位の対象土日数（達成に必要な閉所日数）は7日となる。

月	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	対象日数	現場閉所予定	対象外土日数	月単位判定	対象日数	現場閉所実績	対象外土日数	月単位判定											
日	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									22										
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水																		
適用				対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	8-1=7日以上の閉所が必要																																				
計画	作業	作業	休日	正月	正月	正月	正月	正月	正月	休日	休日	作業	作業	作業	作業	作業	休日	休日	作業	作業	作業	作業	作業	休日	休日	作業	作業	作業	22	7	1	クリア	22	7	1	達成										
実施	作業	作業	休日	正月	正月	正月	正月	正月	正月	休日	休日	休日	作業	作業	作業	作業	作業	休日	休日	作業	作業	作業	作業	作業	休日	休日	作業	作業	作業																	

対象日数 = 28 - 6 = 22日

## 広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事)(R7.10)

### ● 工事途中で月単位の週休2日が達成できなかった場合

完全週休2日が達成できず、月単位の週休2日も達成できなかった場合は、**通期の週休2日**（対象期間全体で4週8休（8日／28日）以上の現場閉所を確保）に取り組む。

**通期の週休2日は補正廃止 ⇒ 減額変更**

通期補正は廃止となったが、**働き方改革推進**の趣旨から、工事完了まで通期の週休2日に取り組む。

## ● 工事検査成績評定について

いずれかの週休2日を達成した場合は、考査項目別運用表の工程管理の以下の項目で評価する。

【監督員】  施工計画書に基づき週休2日を達成した。

【工事担当課長】  週休2日を達成した。

完全週休2日：原則 a 評価

月単位又は通期の週休2日：原則 b 評価

他の項目と総合的に判断して他の評価とすることは妨げない。

※週休2日未達成の場合における減点等のペナルティはない。

広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事)(R7.10)

● 達成内容による**工事費補正**と**工事成績評定**

達成内容	補正係数	工事担当課長の評価 (工程管理)
完全週休2日	完全週休2日	原則 a 評価
月単位の週休2日	月単位の週休2日	原則 b 評価
通期の週休2日	補正なし	
未達成	補正なし	週休2日評価なし

## 広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事)(R7.10)

### ● 現場閉所日を管理する帳票の変更

休日等取得計画・実績表 (R7.10) 完全週休2日に対応

施工中の達成状況は工事週報又は工事日報により行う。  
受注者の責によらず代替閉所日の設定が不可能な現場作業を余儀なくされる土日がある場合はその理由を日報又は週報に記載する。

月単位又は通期に取り組む場合も継続使用する。

受注者は、通期に取り組んだ場合においても工事完了時に実績を記載した休日等取得計画・実績表 (R7.10) を発注者に提出しなければならない。

# 広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事)(R7.10)

## ● 休日等取得計画・実績表 (R7.10) の入力方法

工事着手日： 2025/11/3

工事完了日： 2026/8/30

入力凡例	
作業日・休日	対象外期間
作業：作業日 休日：現場閉所日	夏休：夏季休暇(8/13~8/15) 正月：年末年始休暇(12/29~1/3) 中止：一時中止期間・工場製作のみ 特別：受注者に責のない代替閉所不可の土日作業

完全	月単位	通期
達成	達成	達成

1 期 間 目	月	第1週							第2週							第3週							第4週							週単位 第1週			週単位 第2週			週単位 第3週			週単位 第4週			月単位				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	現場閉所日数	対象外土日数	週単位判定	現場閉所実績	対象外土日数	月単位判定											
日	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																		
適用	着手日																			対象外																										
計画	作業	作業	作業	作業	作業	休日	休日	作業	作業	作業	作業	作業	休日	休日	作業	作業	作業	作業	作業	休日	休日	作業	作業	作業	作業	作業	休日	休日	2		達成	2		達成	1	1	達成	2		達成	7	1	達成			
実施	作業	作業	作業	作業	作業	休日	休日	作業	作業	作業	作業	作業	休日	休日	作業	作業	作業	作業	作業	特別	休日	作業	作業	作業	作業	作業	作業	休日	休日																	

広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事)(R7.10)

- 休日等取得計画・実績表 (R7.10) のダウンロード

水道局ホームページ



事業者の方へ



工事・建設コンサルタント業務関連トップページ



建設工事トップページ




週休2日工事



# 広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事)(R7.10)

## 週休2日工事フロー (R7.10)

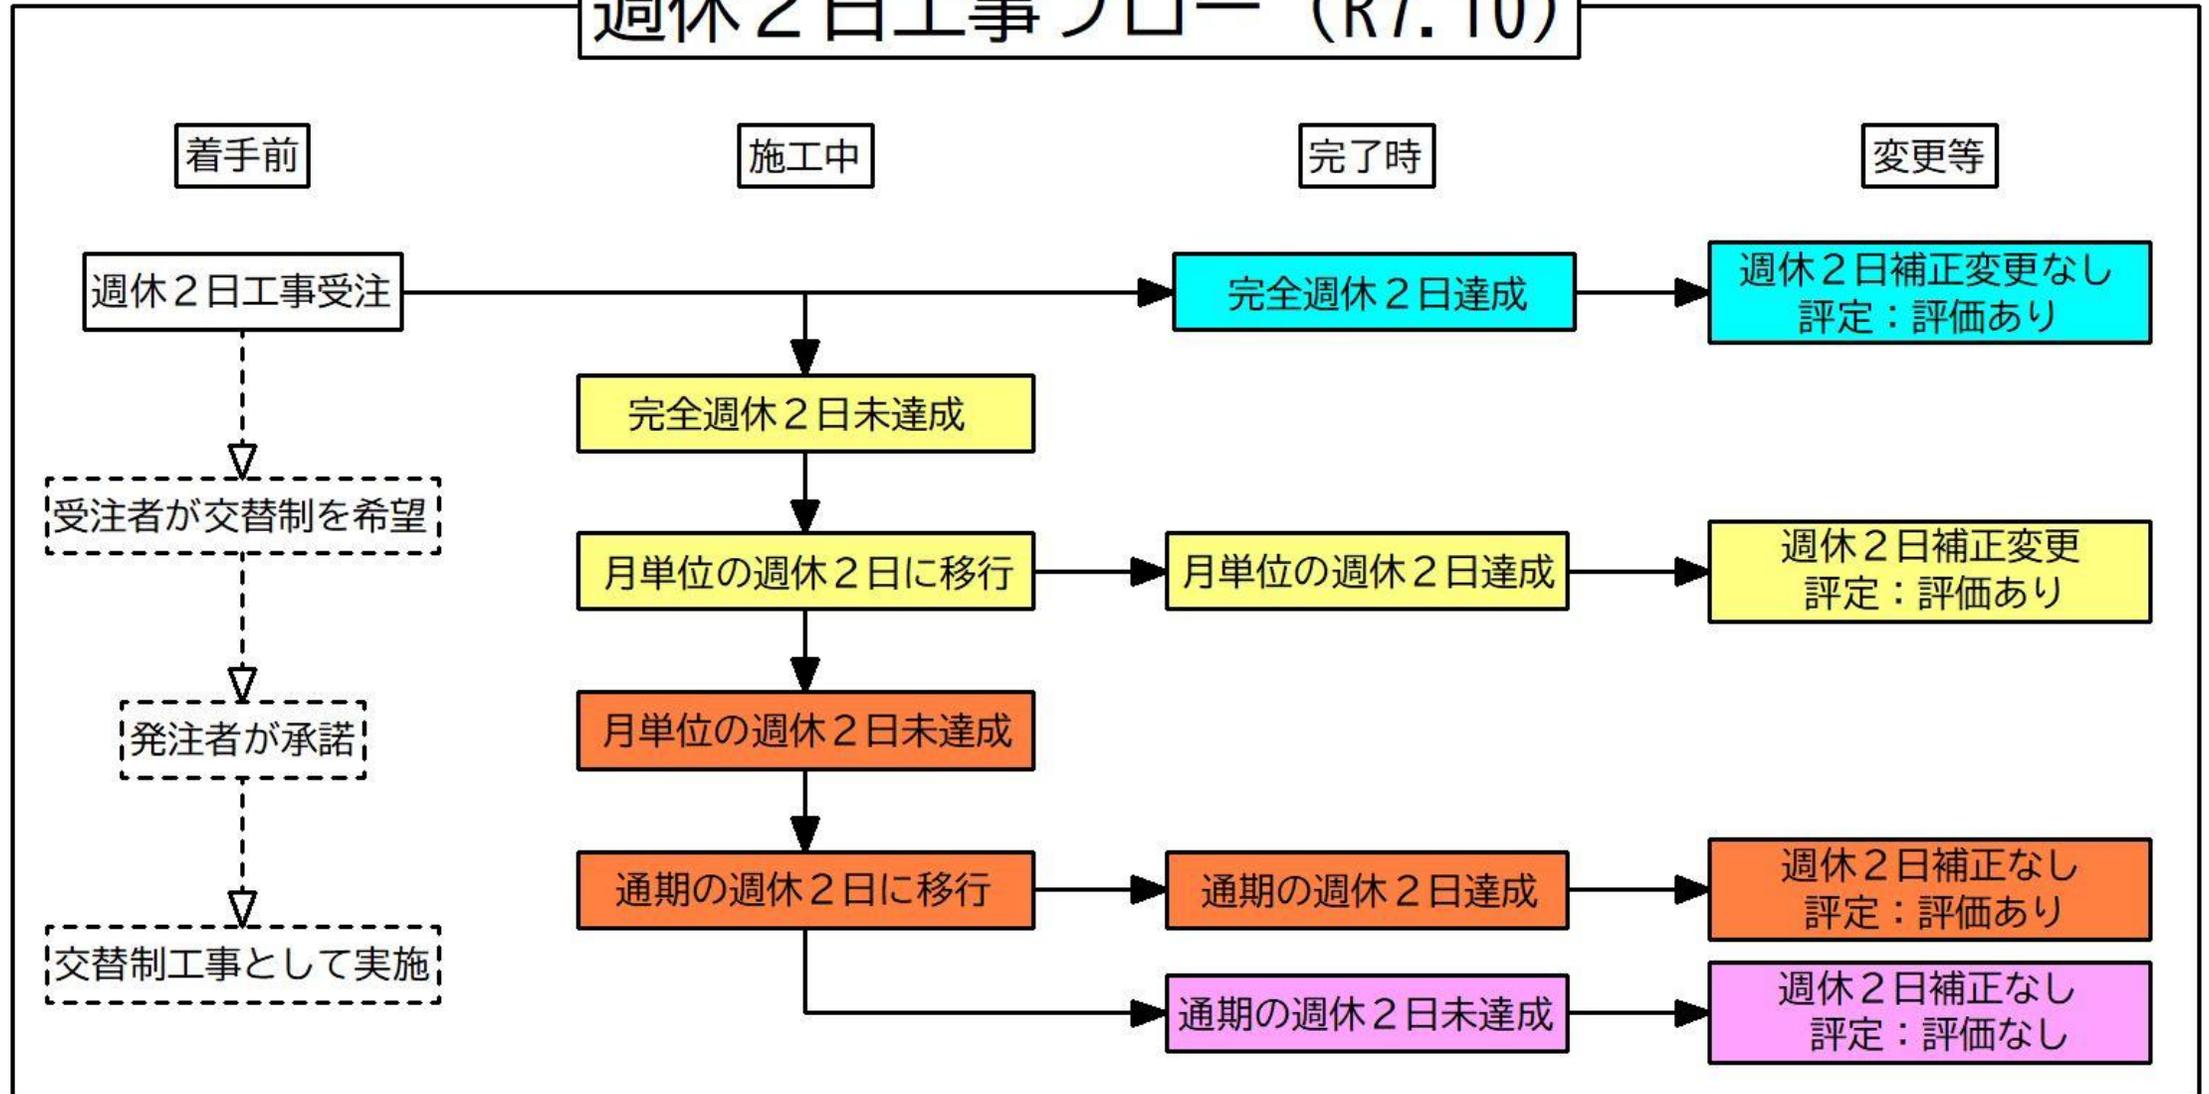

## 広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事)(R7.10)

### ● 週休2日交替制工事への変更について

週休2日工事の受注者が希望する場合は、別に定める

【広島市水道局週休2日交替制工事試行要領(土木工事及び配管工事)(R7.10)】による  
工事（完全週休2日交替制工事）へ実施方法を変更することができる。

広島市水道局では、当初から週休2日交替制工事として  
発注する土木工事及び配管工事はない。

