



試行要領・Q&Aのダウンロードはこちらから

広島市水道局週休2日**交替制**工事試行要領 (土木工事及び配管工事) **(R7.10)**について



広島市水道局技術部技術管理課



適用される要領の年版は特記仕様書で確認

●週休2日交替制工事の実施

広島市水道局が発注した週休2日工事において、**受注者が工事の実施方法を週休2日交替制工事に変更することを希望する場合、対象者の休日の管理方法等について発注者の承諾を得て実施する。**

実施方法を変更した工事は、完全週休2日交替制を達成したものととして速やかに変更契約を行い、最終変更契約時に実績に応じた設計変更を行う。

●発注者の承諾

対象者の休日確保するための施工体制の内容

休日取得状況を証明する方法

現場代理人が休日取得する場合の施工体制

発注者と連絡を取れる現場連絡員の配置等



工事打合せ簿 → 承諾 → 施工計画書に記載して提出

●週休2日交替制工事の種類

- ① 完全週休2日交替制工事
- ② 月単位の週休2日交替制工事
- ③ 通期の週休2日交替制工事



●**完全**週休2日交替制とは



対象者が、交替しながら休日を取得して**すべて**
の週単位の休日率が**28.5%(2日/7日)**以
上となる休日の確保に取り組むことをいう。

●完全週休2日交替制工事の週単位とは

週休2日交替制における週単位とは、工事着手日から起算して工事完了日までの期間を7日ごとに分けた期間のことをいい、工事全体（全対象者）で共通とする。

すべての週単位で休日率が28.5%以上の場合に完全週休2日交替制を達成したものとする。



●月単位の週休2日交替制とは

完全週休2日交替制を達成できなかった場合において、対象者が交替しながら休日を取得して全ての月単位の休日率が28.5%(8/28日)以上となる休日の確保に取り組むことをいう。

当初から月単位の週休2日交替制として取り組むことは認められない。

●週休2日交替制工事の月単位

週休2日交替制における月単位とは、歴月によらず、工事着手日から起算して工事完了日までの期間を28日ごとに分けた期間のことをいい、工事全体（全対象者）で共通とする。

すべての月単位で休日率が28.5%以上の場合に月単位の週休2日交替制を達成したものとする。



●通期の週休2日交替制とは

完全週休2日交替制及び月単位の週休2日交替制を達成できなかった場合において、対象者が交替しながら休日を取得して対象期間全体の休日率が28.5%(8/28日)以上となる休日の確保に取り組むことをいう。

●週休2日交替制工事の**対象者**



対象者とは、現場の施工管理を行う者、建設現場の直接的な作業を行う者及び交通誘導警備員とする。

●週休2日交替制工事の休日率とは ?

休日率とは、対象者ごとの「週単位」又は「月単位」又は「通期」の対象日数における休日取得日数の割合を算出し、合算した値を対象者数で割って平均した値のことをいう。

●週休2日交替制工事の対象期間

対象期間とは、対象者ごとの現場従事開始日から現場従事最終日までの期間から対象外期間を除いた期間とする。

つまり、週単位及び月単位は工事全体(全対象者)で共通だが、対象期間は対象者ごとで異なる。



●対象外期間

- ① 年末年始6日間、夏季休暇3日間
- ② 工場製作のみを実施している期間
- ③ 工事全体を一時中止している期間
- ④ 受注者の責によらず、現場作業を余儀なくされる期間
- ⑤ ①～④の期間を含む週単位
- ⑥ 休日率が50%以上となる対象者の週単位
- ⑦ 7日未満の週単位

※対象外期間は完全・月単位・通期ともに共通

広島市水道局週休2日交替制工事試行要領(土木工事及び配管工事) (R7.10)

●対象外期間⑤⑥⑦の例

⑤【①～④の期間を含む週単位】の例

対象者 \ 月日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	個別 休日率
水道 太郎	作業	作業	作業	休日	作業	夏休	夏休	対象外

⑥【休日率が50%以上となる対象者の週単位】の例

対象者 \ 月日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	個別 休日率
水道 太郎	作業	休日	作業	休日	休日	休日	作業	対象外

⑦【7日未満の週単位】の例

対象者 \ 月日	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	個別 休日率
水道 太郎	作業	作業	作業	休日	作業	休日	作業	28.60%
水道 次郎			作業	作業	作業	休日	作業	対象外

広島市水道局週休2日交替制工事試行要領(土木工事及び配管工事) (R7.10)

●休日率を管理する帳票

休日取得状況表 (R7.10) 完全週休2日交替制に対応



【実施状況の確認】

完全週休2日交替制

休日取得状況表【完全】(R7.10) 毎週単位提出

月単位の週休2日交替制

休日取得状況表【月単位・通期】(R7.10) 毎月単位提出

通期の週休2日交替制

休日取得状況表【月単位・通期】(R7.10) 対象期間完了後提出

広島市水道局週休2日交替制工事試行要領(土木工事及び配管工事) (R7.10)

●休日取得状況表の入力方法 (1)

休日取得状況表【月単位・通期】(R7.10)
(週休2日交替制工事)

工事名	●●●●地区配水管改良工事	受注者	◆◆建設(株)
工事着手日	2025/10/1	工事完了日	2026/10/1

対象外期間
<ul style="list-style-type: none"> ・夏季休暇、年末年始休暇 ・工場製作のみを実施している期間 ・工事全体を一時中止している期間 ・受注者の責によらず、現場作業を余儀なくされる期間 ・上記の期間を含む週単位 ・休日率が50%以上の月単位又は通期 ・7日未満の週単位

2025/8/26 時点

月単位	
通期	
通期の休日率	

休日率 = 対象者ごとの (休日数 ÷ 対象日数) (%) の合算 ÷ 対象者数

立	第1週							第2週							第3週							第4週							実績		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	対象日数	休日数	月単位判定
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
日	着手日																														
実	実施																														
	【月単位・通期】	【完全】	使い方	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								

広島市水道局週休2日交替制工事試行要領(土木工事及び配管工事) (R7.10)

●休日取得状況表の入力方法 (2)

対象者別休日等管理表

工事名	●●●●地区配水管改良工事
-----	---------------

対象者名	水道 太郎
------	-------

着手日	2025/10/1
完了日	2026/10/1

	年月日	曜日	従事状況	内訳	週単位 休日率
1	2025/10/1	水	作業	作業	28.60%
	2025/10/2	木	作業	5	
	2025/10/3	金	休日	休日	
	2025/10/4	土	作業	2	
	2025/10/5	日	休日	その他	
	2025/10/6	月	作業	0	
	2025/10/7	火	作業	0	
2	2025/10/8	水		作業	対象外
	2025/10/9	木		0	
	2025/10/10	金		休日	
	2025/10/11	土		0	
	2025/10/12	日		その他	
	2025/10/13	月		0	
	2025/10/14	火		7	

広島市水道局週休2日交替制工事試行要領(土木工事及び配管工事) (R7.10)

●休日取得状況表の入力方法 (4)

月単位	第1週							第2週							第3週							第4週							実績			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	対象日数	休日数	月単位判定	
月	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
対象者名	着手日																															
水道 太郎	実施	作業	作業	休日	作業	休日	作業	作業																					7	2	28.6%	
	判定	作業	作業	休日	作業	休日	作業	作業	対象外	28.6%																						
	実施																														達成	
	判定																															

広島市水道局週休2日交替制工事試行要領(土木工事及び配管工事) (R7.10)

●休日率の算定

対象者	週単位内従事状況							個別 休日率	休日率
A	作業	作業	休日	休日	作業	作業	作業	28.6%	85.8 ÷ 3人 = 28.6%
B	作業	作業	作業	休日	休日	作業	休日	42.9%	
C	作業	作業	作業	作業	休日	作業	作業	14.3%	
D			作業	作業	休日	休日	作業	対象外	
計								85.8%	28.5%以上達成

● 通期の補正の廃止

週休2日交替制工事の補正		
達成実績	労務費	現場管理費
完全	1. 0 2	1. 0 3
月単位	1. 0 2	1. 0 2
通期	補正なし	補正なし



●工事検査成績評定について

いずれかの週休2日交替制工事を達成した場合は、以下の項目で評価する。

【監督員】 施工計画書に基づき週休2日を達成した。

【工事担当課長】 週休2日を達成した。


完全週休2日：原則 a 評価

月単位又は通期の週休2日：原則 b 評価

他の項目と総合的に判断して他の評価とすることは妨げない。

達成されなかった場合における減点等のペナルティはない。

広島市水道局週休2日交替制工事試行要領(土木工事及び配管工事) (R7.10)

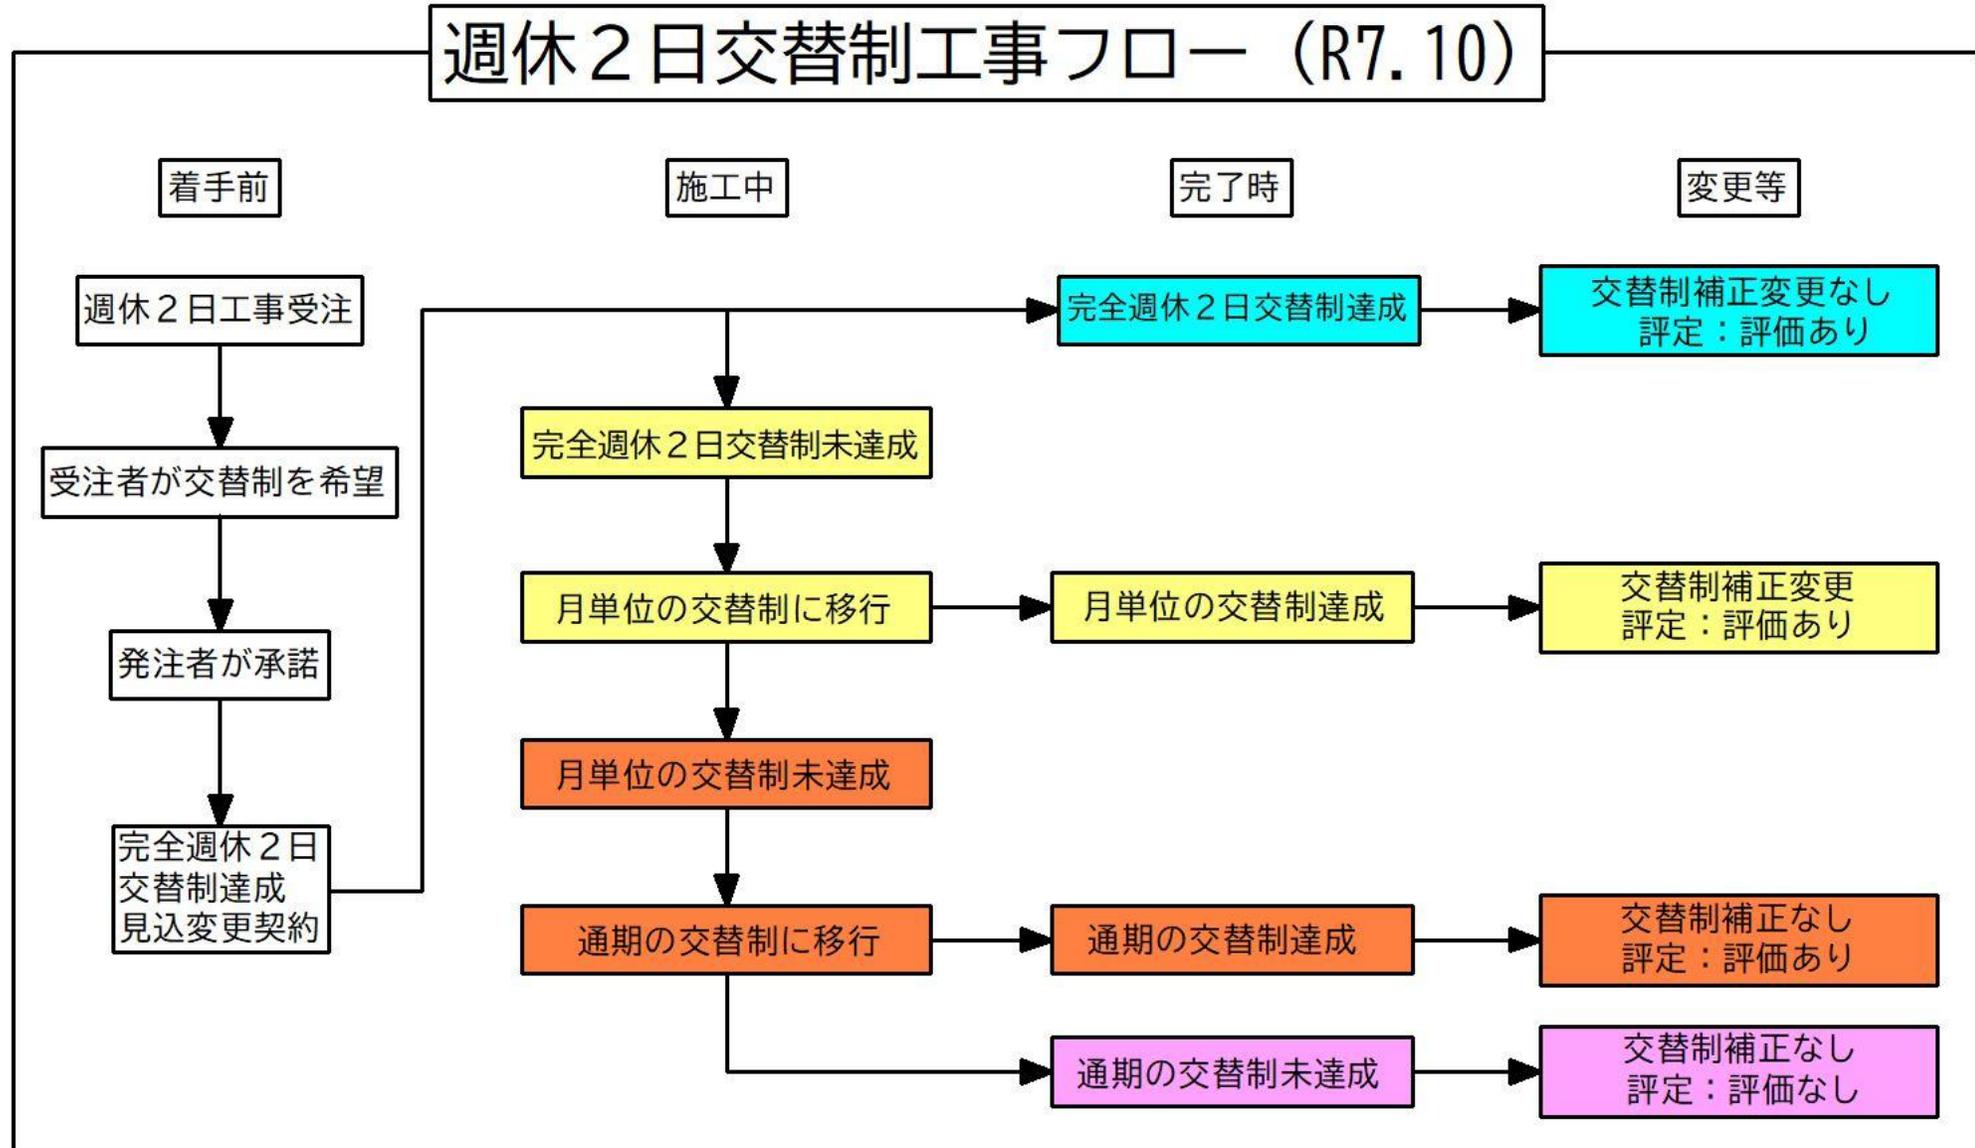

広島市水道局週休2日交替制工事試行要領(土木工事及び配管工事) (R7.10)

●週休2日と週休2日交替制の違い

項目	週休2日	交替制
実施方法	完全（月単位）	完全（月単位）
達成判定対象	現場閉所実績	対象者の休日率
労務費補正係数	1.02（1.02）	1.02（1.02）
共通仮設費率補正係数	1.02（1.01）	なし
現場管理費率補正係数	1.03（1.02）	1.03（1.02）
実施方法の変更	交替制へ変更可	変更不可
